

(仮称)旧庁舎跡地にぎわい創出整備事業

工事説明会

松井・宇佐美・とみた・環境デザイン研究所

共同企業体



この度「(仮称)旧庁舎跡地にぎわい創出整備事業」を、松井・宇佐美・とみた・環境デザイン研究所共同企業体にて工事着手させて頂く運びとなりました。

工事の施工に当たりましては、近隣の皆様に対し工事によるご迷惑を極力なくす様に努め、円満に近隣関係の保持並びに安全第一を念頭に、慎重に作業を進める所存でございます。

皆様方には工事中何かとご迷惑をお掛けすることがあるかと存じますが、下記担当者が工事管理を行いますので、何かございましたらご連絡頂ければ幸いと存じます。


皆様方のご理解ご協力を頂けますよう宜しくお願い申し上げます。

(担当連絡先)

共同企業体 代表企業 松井建設(株)名古屋支店
〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12 名古屋若宮ビル7階
TEL:052-249-4771 FAX:052-249-4772

- ・ 着工2022年9月～12月
建築部 栗山、営業課 山本
- ・ 2023年1月～2024年1月
工事課 青木

工程表

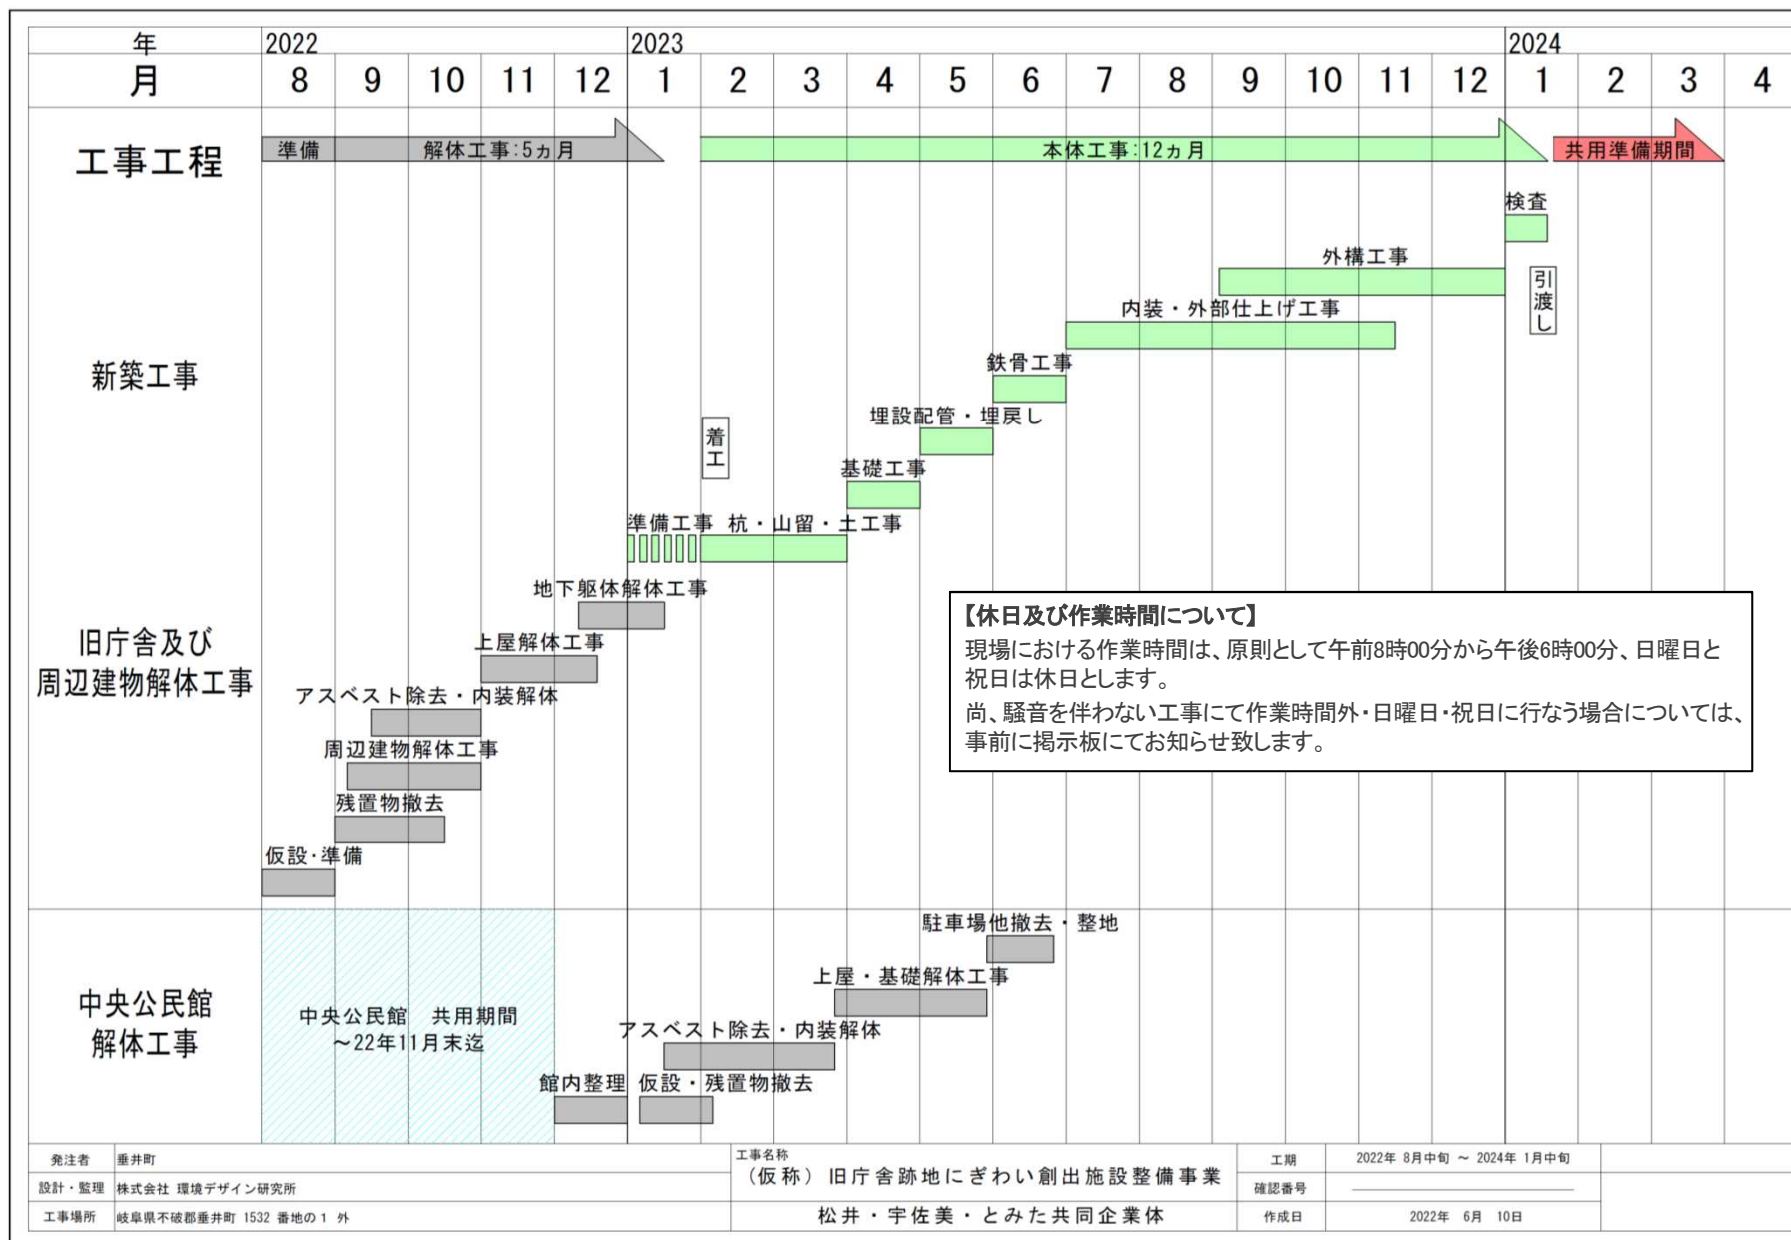

仮設計画 '23年1月～6月

新設：基礎・鉄骨工事

- 1月 準備工事
- ↓
- 2月～3月 杭・山留・土工事
- ↓
- 4月 基礎工事
- ↓
- 5月 埋設配管・埋戻し
- ↓
- 6月 鉄骨工事

中央公民館：解体工事

- 1月～3月 アスベスト除去・内装解体
- ↓
- 3月末～5月 上屋・基礎解体
- ↓
- 6月 境界塀・駐車場他撤去、整地



【危険防止の対策】

本工事を進めるにあたり、ご近隣の皆様の危険防止の為、仮囲い・メッシュシート等の防護設備を設け安全施工に努めます。

【騒音・振動の対策】

工事に伴う騒音・振動・粉塵等によるご近隣の皆様に対するご迷惑を極力抑えるべく、充分注意して作業を行います。

【作業内容のお知らせ】

作業内容につきましては、週間予定表を現場北面・南面の仮囲いに掲示します。

仮設計画 '23年7月～'24年1月中旬

新設：仕上工事

7月～11月中旬
内装・外部仕上げ工事

↓
9月～12月 外構工事

↓
1月 各種検査

↓
1月中旬 引渡し



工事車輛運行ルート

